


■ 平面図

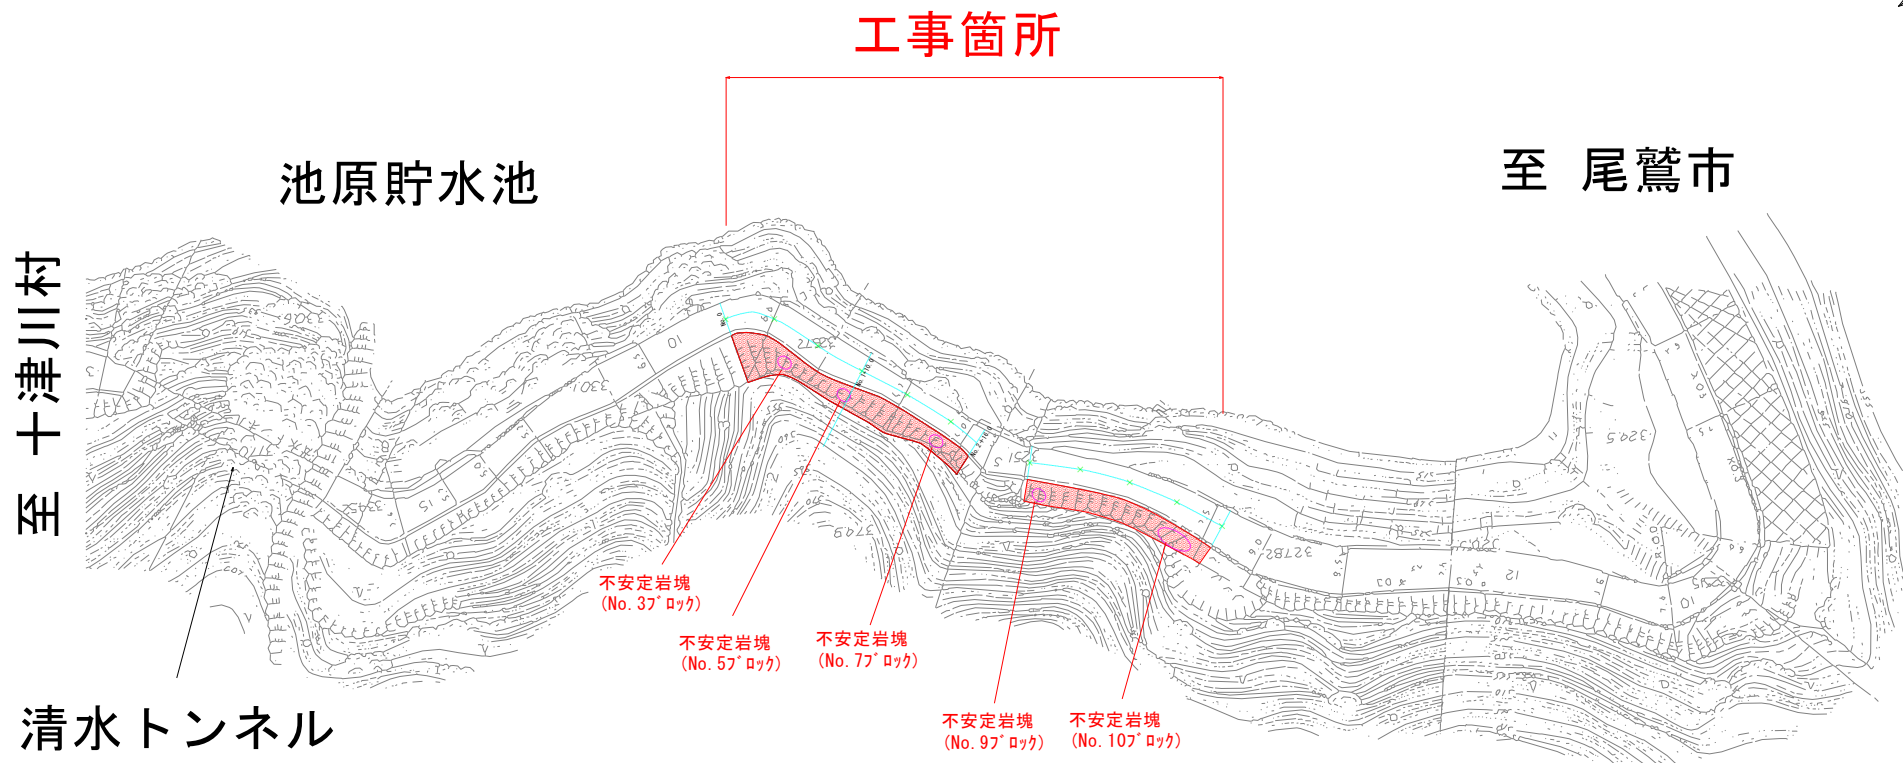

■ 進捗状況

- 6月11日：支障木の伐採完了
- 6月14日：落石防止ネット撤去完了
- 6月17日：不安定岩塊の掘削に着手
- 7月10日：不安定岩塊の掘削完了
- 7月17日：掘削完了後の現場状況等を有識者に確認
- 8月21日：落石防止ネット設置に着手
- 9月9日：落石防止ネット設置完了
- 9月9日：通行止め解除（17：00～）

■ 現地状況（工事写真等）

R6.9.6 対策工事完了後



R6.9.5 対策工事完了後

