


# 大和川流域における 雨水貯留浸透施設等の整備状況

令和6年1月31日  
奈良県

# 大和川特定都市河川流域における目標対策量

- ◆昭和57年の大和川大水害を契機に、大和川流域を洪水被害から守るため、県と市町村で流出抑制に取り組むことに合意し、昭和60年7月に「流域整備計画(p.2参照)」を策定
- ◆令和3年12月に特定都市河川の指定を受け、令和4年5月に「大和川流域水害対策計画」を策定し、目標対策量を雨水貯留浸透施設で68.29万m<sup>3</sup>、水田貯留を含むため池の治水利用で183.2万m<sup>3</sup>とした。

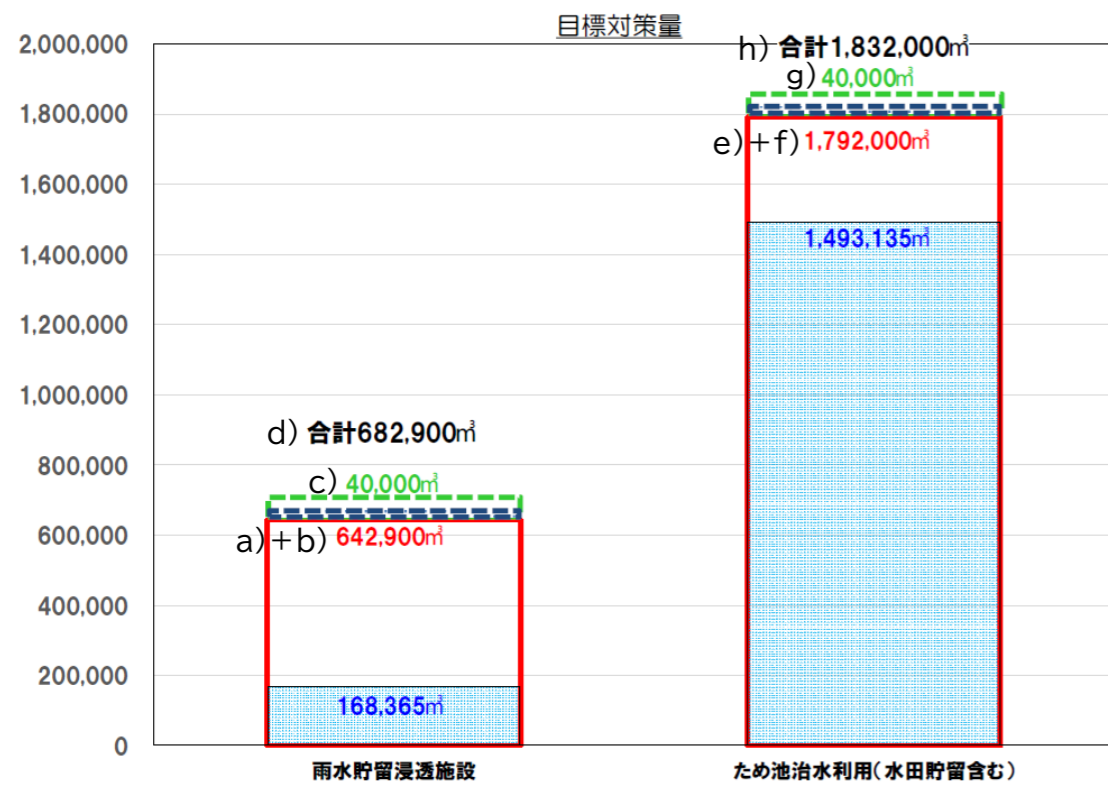

大和川流域水害対策計画における対策量	雨水貯留浸透施設	ため池治水利用(水田貯留含む)
①大和川流域総合治水対策の「流域整備計画」で定められた対策量	a) 11.9 万m <sup>3</sup>	e) 170 万m <sup>3</sup>
②「奈良県平成緊急内水対策事業」で定められた対策量	b) 52.39万m <sup>3</sup>	f) 9.2万m <sup>3</sup>
③計画期間中の更なる流域対策を積極的に進める今後5年間の対策予定量(民間事業者による対策含む)	c) 4.0 万m <sup>3</sup>	g) 4.0万m <sup>3</sup>
合計	d) 68.29万m <sup>3</sup>	h) 183.2万m <sup>3</sup>

大和川流域水害対策計画における  
雨水貯留浸透施設の整備及びため池の治水利用による目標対策量

# 大和川流域総合治水対策の「流域整備計画」で定められた対策量

◆流域整備計画では、奈良県と市町村をあわせて約180万 $m^3$ の貯留対策に取り組むことになっている。(最小必要量)



機関名	雨水貯留浸透 施設対策量 ( $m^3$ )	ため池治水 利用対策量 ( $m^3$ )	機関名	雨水貯留浸透 施設対策量 ( $m^3$ )	ため池治水 利用対策量 ( $m^3$ )
奈良市	14,610	310,500	田原本町	2,440	29,700
大和高田市	3,790	18,300	高取町	1,080	18,900
大和郡山市	5,410	71,700	明日香村	540	15,900
天理市	3,520	65,700	新庄町	1,080	22,500
橿原市	6,770	40,200	当麻町	810	17,500
桜井市	5,140	30,300	香芝町	2,710	55,300
御所市	4,060	48,900	上牧町	1,350	21,600
生駒市	5,410	62,700	王寺町	1,350	21,600
平群町	1,350	20,700	広陵町	1,900	32,400
三郷町	1,080	25,800	河合町	1,350	19,500
斑鳩町	1,630	29,700	大淀町	-	1,500
安堵町	540	9,400	小計	69,000	1,000,000
川西町	810	6,700	奈良県	50,000	700,000
三宅町	270	3,000	合計	119,000	1,700,000

合計181.9万 $m^3$

附則1 今後早急に検討するものについては、成案が出来次第、  
 実施要領の変更により、具体的内容を組み込むものとする。


【大和川流域整備計画実施要領より】



# 大和川流域総合治水対策の「流域整備計画」で定められた対策量の進捗状況

- ◆ 令和5年3月末時点で、最小必要量の98%を達成
- ◆ 県は126%を達成、市町村は78%の達成にとどまっているものの、近年、市町村の対策率も伸びている

## 流域対策(ため池治水利用+雨水貯留浸透施設+水田貯留)の進捗状況

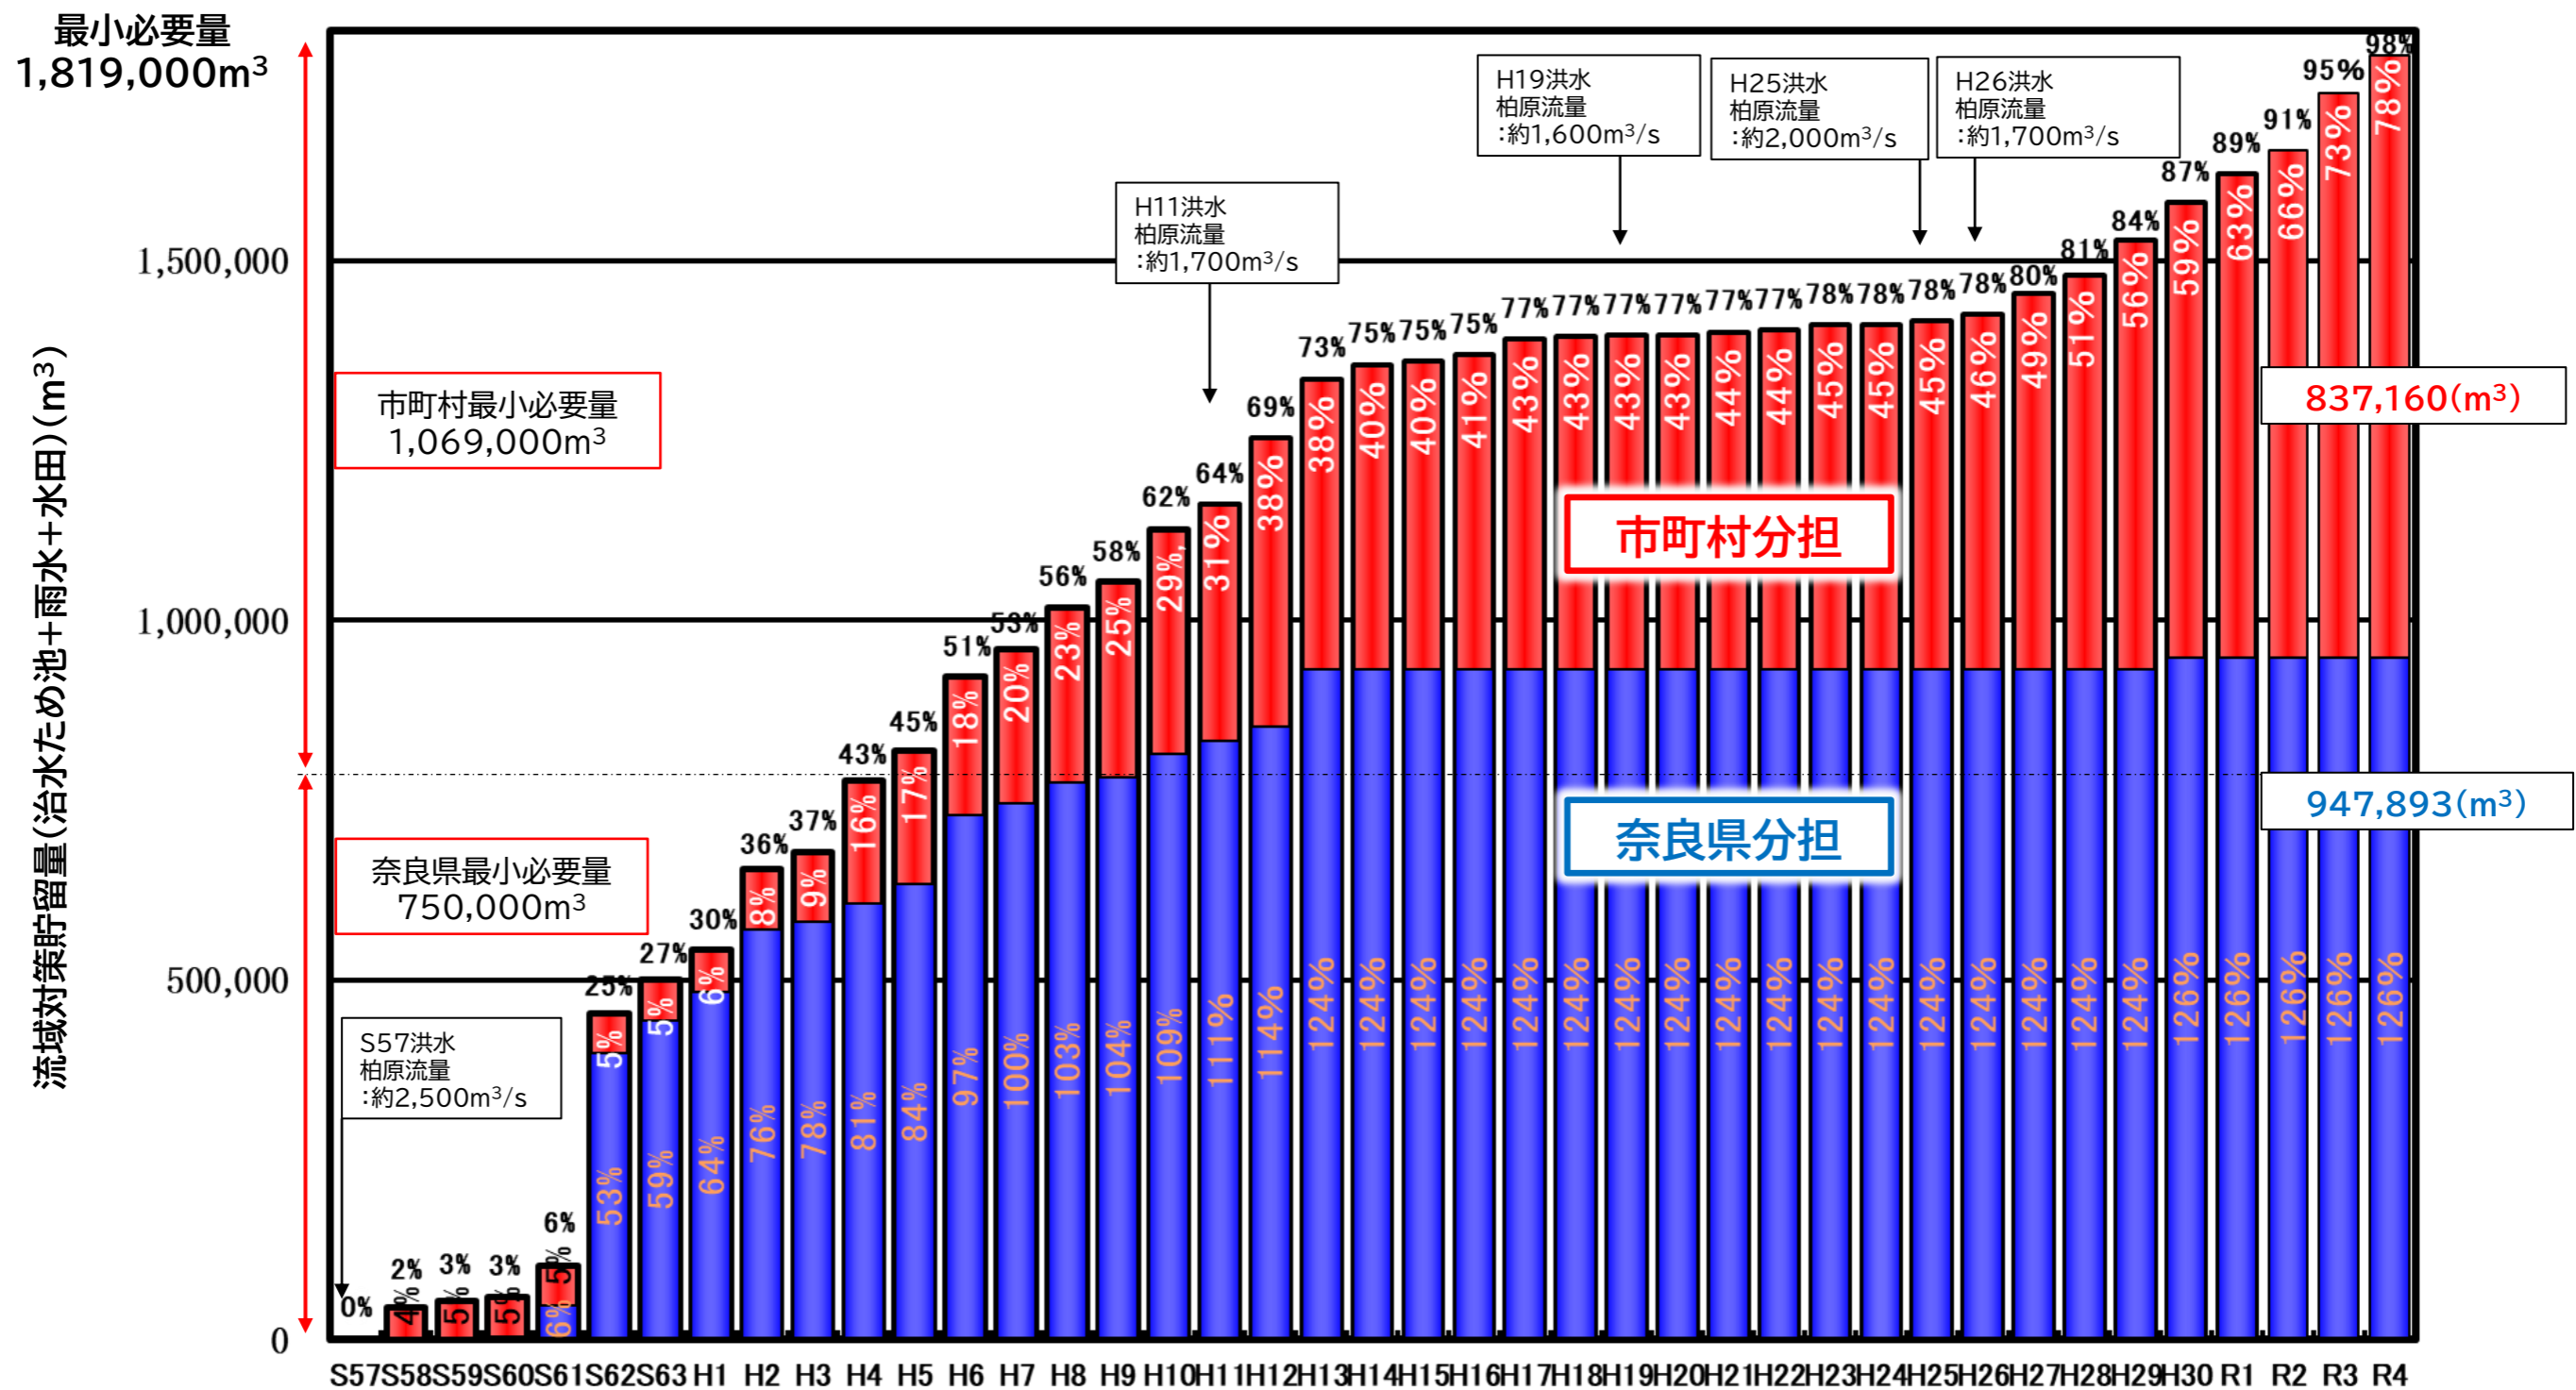

※ 水田貯留による対策量を含む

# 直近一年の進捗状況(前回報告時からの進捗率)

奈良県HP公開予定

- ◆ 御所市、生駒市、平群町、高取町、広陵町が新たに「ため池治水」などの「貯める対策」を実施
- ◆ その結果、**市町村全体の対策率**は昨年度と比べて**73%から78%に増加**
- ◆ 一方、対策率が伸び悩む市町もあり、浸水被害の軽減に向けて**引き続き貯める対策の推進が必要**

市町村名	【C】 最小必要量 (m3)	ため池+雨水貯留+水田 (R4.3)		ため池+雨水貯留+水田 (R5.3)		直近一年の増加量 B-A 増加量 (m3)	直近一年の進捗率 (B-A)/C×100 進捗率 (%)	取組状況 (R5.3現在)		
		【A】 対策済量	対策率 (%)	【B】 対策済量	対策率 (%)			ため池 治水利用	雨水貯留 浸透施設	水田貯留
奈良市	325,110	110,594	34.0	110,594	34.0			検討中	検討中	予定なし
大和高田市	22,090	27,812	125.9	27,812	125.9			予定なし	実施中	予定なし
大和郡山市	77,110	60,642	78.6	60,642	78.6			実施中	検討中	実施中
天理市	69,220	46,575	67.3	46,575	67.3			実施中	予定なし	予定なし
橿原市	46,970	54,294	115.6	54,294	115.6			予定なし	予定なし	予定なし
桜井市	35,440	16,444	46.4	16,444	46.4			予定なし	検討中	予定なし
御所市	52,960	29,730	56.1	32,810	62.0	3,080	5.8	検討予定	検討予定	予定なし
生駒市	68,110	30,170	44.3	75,170	110.4	45,000	66.1	実施中	実施中	予定なし
香芝市	58,010	38,607	66.6	38,607	66.6			検討予定	予定なし	予定なし
葛城市	41,890	50,289	120.1	50,289	120.1			実施中	予定なし	予定なし
平群町	22,050	39,223	177.9	41,021	186.0	1,798	8.2	予定なし	検討予定	予定なし
三郷町	26,880	46,396	172.6	46,396	172.6			予定なし	実施中	予定なし
斑鳩町	31,330	27,689	88.4	27,689	88.4			予定なし	実施中	予定なし
安堵町	9,940	37,076	373.0	37,076	373.0			検討予定	予定なし	検討予定
川西町	7,510	8,458	112.6	8,458	112.6			検討予定	予定なし	予定なし
三宅町	3,270	7,520	230.0	7,520	230.0			実施中	検討予定	予定なし
田原本町	32,140	40,810	127.0	40,810	127.0			実施中	実施中	検討予定
高取町	19,980	13,956	69.8	15,216	76.2	1,260	6.3	予定なし	予定なし	予定なし
明日香村	16,440	16,423	99.9	16,423	99.9			検討中	予定なし	予定なし
上牧町	22,950	11,450	49.9	11,450	49.9			実施中	予定なし	予定なし
王寺町	22,950	23,814	103.8	23,814	103.8			予定なし	検討中	予定なし
広陵町	34,300	14,378	41.9	16,440	47.9	2,062	6.0	予定なし	実施中	実施中
河合町	20,850	25,610	122.8	25,610	122.8			予定なし	実施中	検討予定
大淀町	1,500	6,000	400.0	6,000	400.0			予定なし	予定なし	予定なし
小計	1,069,000	783,960	73.3	837,160	78.3	53,200	5.0			
奈良県	750,000	947,893	126.4	947,893	126.4			予定なし	予定なし	予定なし
合計	1,819,000	1,731,853	95.2	1,785,053	98.1					

## 凡例(ため池+雨水貯留+水田)

- 対策率:0%以上25%未満
- 対策率:25%以上50%未満
- 対策率:50%以上100%未満
- 対策率:100%以上

## 凡例(取組状況)

- 予定なし 当面、検討の予定がないもの
- 検討予定 具体的な候補地は決まっていないが、今後、検討を行っていく予定のもの
- 検討中 具体的な候補地が決まり、関係者と調整中または近々、調整を行う予定のもの
- 実施中 工事中または設計中(関係者と概ね合意済み)
- (対策率100%を超えている場合)
